



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

木模板中工（土木工程） 模擬實務試卷

This document related to the mock test paper of intermediate trade test for Carpenter (Formwork – Civil Construction). Should you require an English version of this document, please contact Trade Test Centre at 2100 9232.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，

惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，

並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，

亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232

傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

© 2015 版權由建造業議會所有。

中級工藝測試試卷

職稱：木模板工（土木工程）

技能等級：半熟練技工

測驗試題：在指定位置按圖完成以下項目：

在試場提供模擬護土牆基模板上，安裝連斜角導牆模板(棘架)，並適當使用板枋、威楞、螺絲栓、花籃、膠杯、鐵釘等穩固構件，以能承受澆注混凝土施工壓力為準。


在試場提供的模擬混凝馬路模板上，閘收口模板，同時安裝六支連接混凝土構件金屬棒，並適當地使用板枋、鐵釘等穩固工件，以能承受澆注混凝土施工壓力為準。

測驗時限：三小時

注意事項：若考生在測試進行時未能做妥安全措施，是項測試將被評為不及格，

全部測試項目以 100 分為滿分，以 60 分或以上為及格。

木模板工(土木工程) 中級工藝測試施工圖

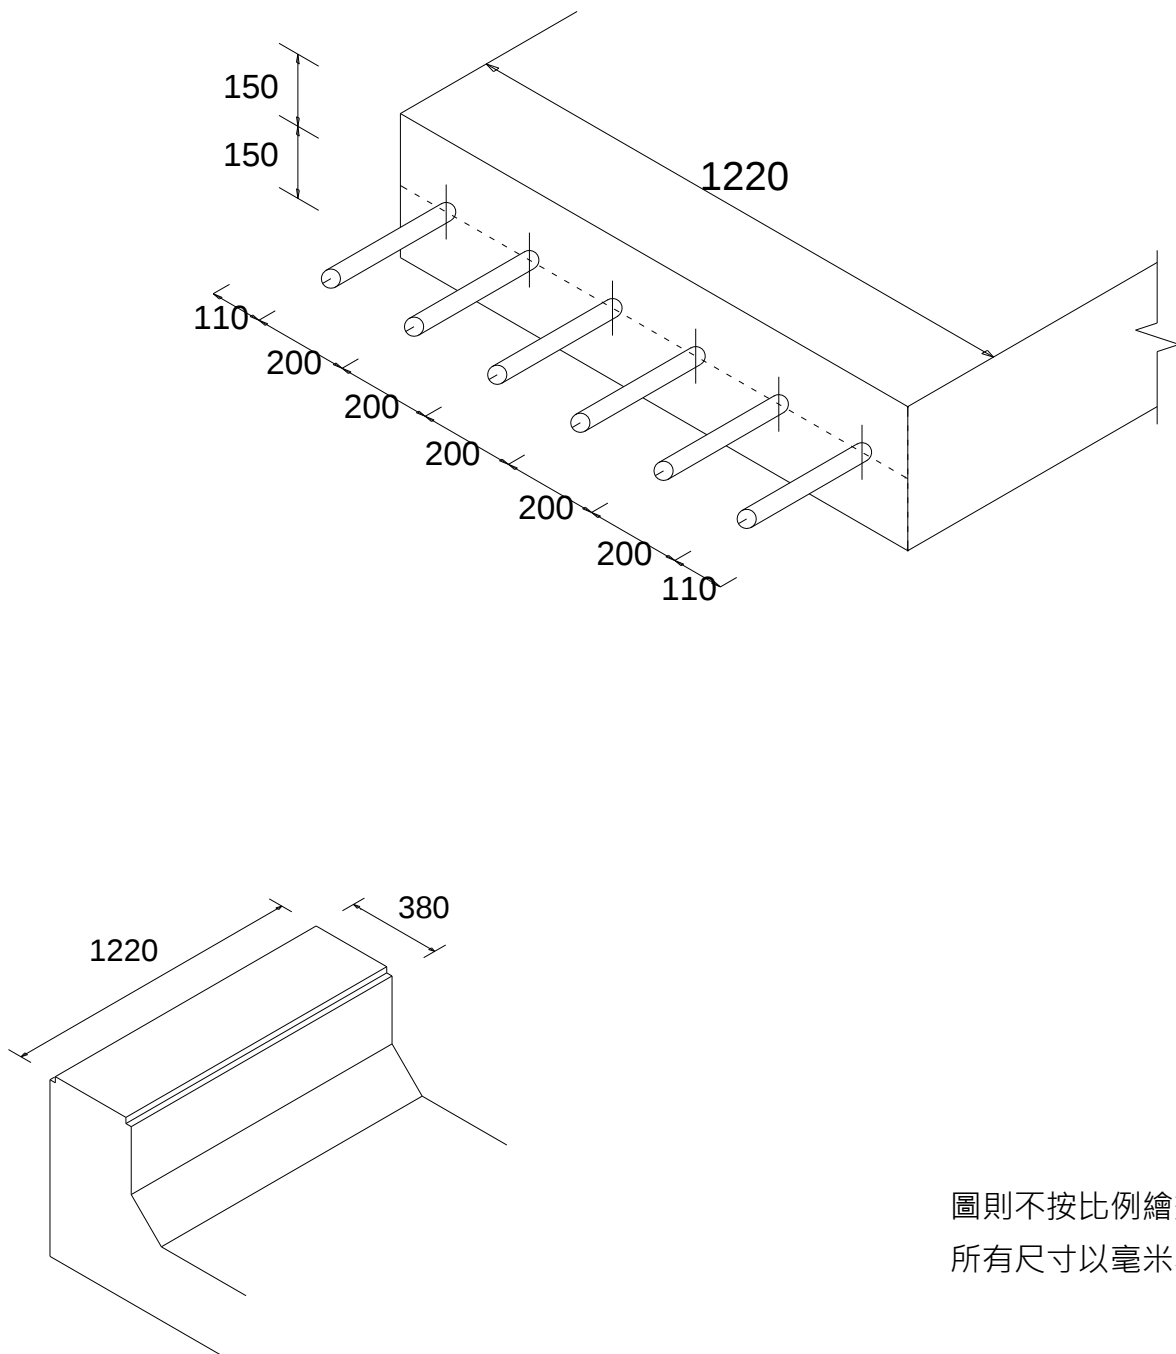

圖則不按比例繪畫
所有尺寸以毫米為單位

應考須知：

1. 考生必須小心閱讀試卷內容，如有疑問，請即向監考員提出。
2. 考生在測試開始前，須詳閱與試題相連的圖則 / 大樣 / 章程。
3. 考生須按圖則及章程要求，進行施工。
4. 考生須攜帶及穿着安全鞋，其他安全配備由試場供給。考生須遵守所有安全措施，以確保安全。
5. 試場供給測試時所需的材料及工具，考生須自行檢查並按本行業的要求適當地調配應用材料；完成測試後必須悉數交還領用工具，如有問題，請向監考員提出。
6. 在試場中考生需自行搬運工具和材料及做妥附帶的工作。
7. 在測試過程中，監考員將會定時拍攝存案。
8. 測試範圍內考生不准使用相機或手提電話進行任何拍攝。
9. 測試範圍內考生不准使用手提電話通話，緊急情況除外。
10. 各項測試評分根據如下：
 - 一. 理解圖則及施工章程
 - 二. 施工前的準備工作
 - 三. 工作程序
 - 四. 施工準確度及品質
 - 五. 施工速度

六. 適當使用和處理材料

七. 正確使用工具及設備

八. 執行安全措施

九. 協調別行的工作

十. 完工後的清理

11. 考生在測試限時過後必須停止施工。

12. 考生在測試完畢後，應將試卷交回監考員，試卷不能帶出試場。

13. 考生切勿以任何形式賄賂監考員，以免觸犯法律；若有此情況，本中心將向廉政公署舉報。

考生若未能做妥安全措施或施工時出現危險情況，均會導致整項測試為不及格
