



窗框中工

模擬實務試卷

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232

傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

© 2017 版權由建造業議會所有。

中級工藝測試試卷

職 稱 ： 窗框工

技能等級 ： 半熟練技工

測試試題 ： 在指定位置按圖完成以下項目的工作：

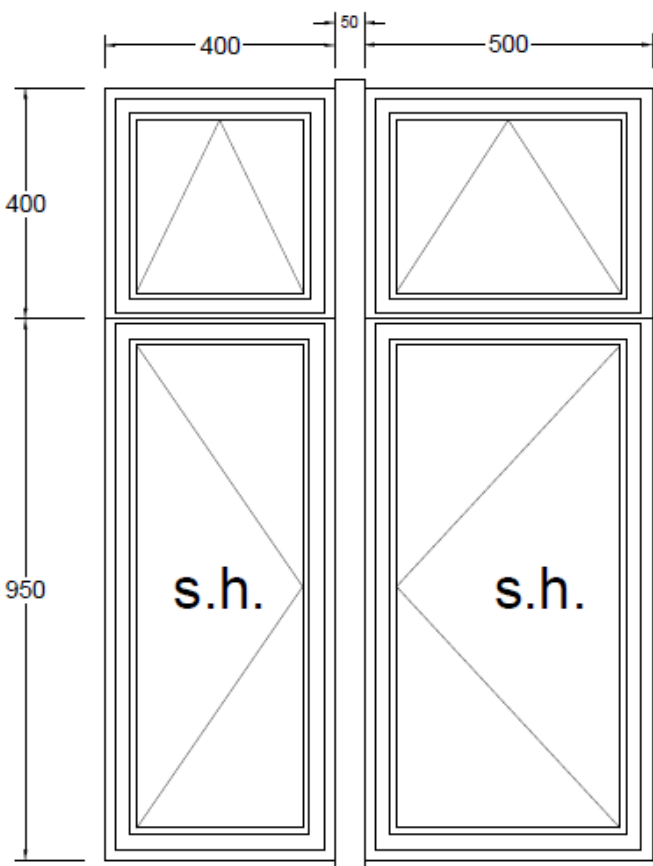
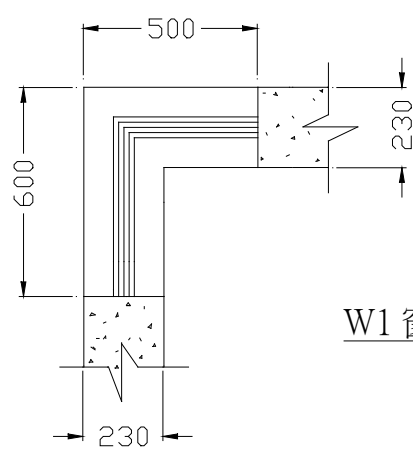
- 一. 按照施工圖一、墨線和平水的要求，安裝一組轉角鋁窗框(W1)； (佔 40 分)
- 二. 按照施工圖二、墨線和平水的要求，安裝一扇平面鋼窗框(W2)； (佔 30 分)
- 三. 按照施工圖三、墨線和平水的要求，安裝一扇不鏽鋼掩門及框(D1)。 (佔 30 分)

測試時限 ： 三小時

- 注意事項 ：
- (一) 施工前，考生須參閱附件中的「應考須知」；
 - (二) 若考生在測試進行時未能做妥安全措施，是項測試將被評為不及格；及
 - (三) 測試試卷共 5 頁。全部測試項目以 100 分為滿分，以 60 分或以上為及格。


考生若未能做妥安全措施或施工時出現危險情況，均會導致整項測試為不及格

窗框工中級工藝測試施工圖一

編號		W1	
內容			
立面圖			<u>安裝轉角鋁窗框(W1)</u> <u>施工要求如下：</u> 1. 轉角夾窗料(方通)與窗框須用螺絲連接； 2. 使用木楔把窗框暫固及定位； 3. 安裝10個磨耳去固定窗框； 4. 窗的垂直及平水的允許偏差為3毫米。
	種類	轉角鋁窗	
	玻璃	不須安裝	
	備註	安裝窗框連窗肉	
		 <u>W1 窗平面圖</u>	
此圖不按比例繪畫 所有尺寸以毫米(mm)為單位			

窗框工中級工藝測試施工圖 二

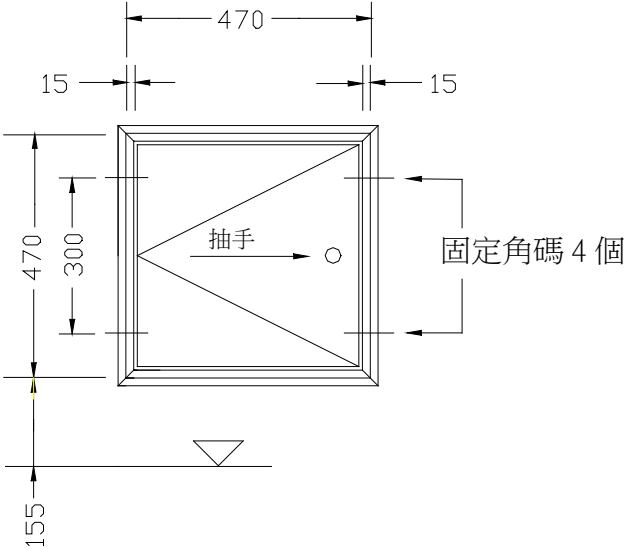
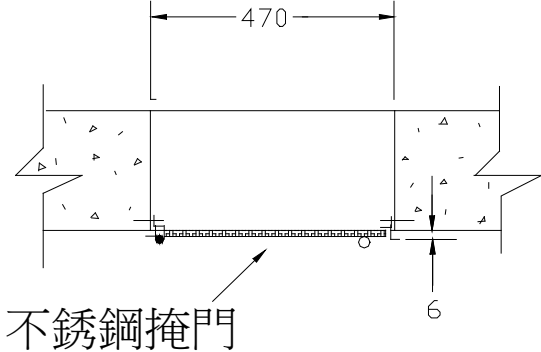
編號		W2	安裝平面鋼窗框(W2) 施工要求如下： 1. 使用木楔把窗框暫固及定位； 2. 安裝10個磨耳去固定窗框； 3. 窗的垂直及平水的允許偏差為3毫米。
內容			
立面圖	800 800 s.h. s.h.		
種類	鋼窗		
玻璃	不須安裝		
備註	安裝窗框		



W2 窗平面圖

此圖不按比例繪畫
所有尺寸以毫米(mm)為單位

窗框工中級工藝測試施工圖三

編號 內容	D1	
立面圖		<u>安裝不銹鋼掩門及框(D1)</u> <u>施工要求如下：</u> 1. 將已裝上排鉸的不銹鋼門與門框組合用拉釘聯接； 2. 安裝不銹鋼門及框於窗洞； 3. 使用角碼把框固定在牆上； 4. 框與牆的平面隙位須為6毫米； 5. 把抽手及磁鐵扣分別裝於門和框上； 6. 框與窗洞的立面間隙約為15毫米。
種類	不銹鋼門	
備註	安裝門框連門肉	
		<u>D1門平面圖</u> 此圖不按比例繪畫 所有尺寸以毫米(mm)為單位

應考須知：

1. 考生必須小心閱讀試卷內容，如有疑問，請即向監考員提出。
2. 考生在測試開始前，須詳閱與試題相連的圖則 / 大樣 / 章程。
3. 考生須按圖則及章程要求，進行施工。
4. 考生須攜帶及穿着安全鞋，其他安全配備由試場供給。考生須遵守所有安全措施，以確保安全。
5. 試場供給測試時所需的材料及工具，考生須自行檢查並按本行業的要求適當地調配應用材料；完成測試後必須悉數交還領用工具，如有問題，請向監考員提出。
6. 在試場中考生需自行搬運工具和材料及做妥附帶的工作。
7. 在測試過程中，監考員將會定時拍攝存案。
8. 測試範圍內考生不准使用相機或手提電話進行任何拍攝。
9. 測試範圍內考生不准使用手提電話通話，緊急情況除外。
10. 各項測試評分根據如下：
 - 一. 理解圖則及施工章程
 - 二. 施工前的準備工作
 - 三. 工作程序
 - 四. 施工準確度及品質
 - 五. 施工速度
 - 六. 適當使用和處理材料
 - 七. 正確使用工具及設備
 - 八. 執行安全措施
 - 九. 協調別行的工作
 - 十. 完工後的清理
11. 考生在測試限時過後必須停止施工。
12. 考生在測試完畢後，應將試卷交回監考員，試卷不能帶出試場。
13. 考生切勿以任何形式賄賂監考員，以免觸犯法律；若有此情況，本中心將向廉政公署舉報。
