

建造業議會

建造安全專責委員會

建造安全專責委員會 2015 年第三次會議於 2015 年 9 月 23 日（星期三）下午 2 時 30 分於香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓 1 號會議室舉行。

建造安全專責委員會 2015 年第三次會議討論摘要：

議程項目	文件	主要議決／進展摘要
3.1	CIC/CSY/R/002/15 (討論文件)	通過進展報告 成員通過 2015 年 6 月 30 日舉行的上次會議之進展報告。
3.2	CIC/CSY/R/002/15 (討論文件)	上次會議續議事項 議程 2.12 項－詳情於議程第 3.11 項報告。(跟進經驗分享－新加坡借鑑考察團) 議程 2.14 項－該議程將於下次建造安全專責委員會 2015 年第四次會議中報告。(跟進 2014 年建造業的工業意外死亡事故報告)。
3.3	CIC/CSY/P/015/15 (待確認文件)	擬修訂「流動式起重機工作安全工作小組」的名稱及職權範圍 成員同意把「流動式起重機工作安全工作小組」名稱更改為「貨車式起重機工作安全工作小組」，以及修訂其職權範圍和成員名單。
3.4	CIC/CSY/P/016/15 (參考文件)	貨車式起重機工作安全工作小組的工作進展 工作小組會議已於 2015 年 7 月 2 日、8 月 13 日及 9 月 14 日舉行，小組成員就吊機操作員的現行培訓和考牌提供一些改善建議，上述建議已交予建造業訓練委員會轄下課程專責小組的機械操作科課程顧問組探討實施的可能性。 成員就貨吊實務試的合格分數提出意見，經商議後，於委員會的議會培訓及發展部代表會轉交予建造業訓練委員會檢視和跟進。 安全提示第 002/15 號－「貨車式起重機的安全－採購及裝配貨車式起重機的考慮事

議程項目	文件	主要議決／進展摘要
		項」，將於議程第 3.5 項討論。
3.5	CIC/CSY/P/017/15 (待確認文件)	<p>安全提示第 002/15 號－「貨車式起重機的安全－採購及裝配貨車式起重機的考慮事項」</p> <p>成員原則上確認安全提示第 002/15 號。</p> <p>[會後補註：委員會 2015 年第三次會議後，香港專業吊運聯會於 2015 年 9 月 29 日以電郵形式提交意見，貨車式起重機工作安全工作小組的相關成員與香港專業吊運聯會已於 2015 年 10 月 9 日舉行會議，就安全提示第 002/15 號的意見及需作出修訂的地方作進一步討論。]</p>
3.6	CIC/CSY/P/018/15 (參考文件)	<p>升降機槽工作的工地安全專責小組的工作進展</p> <p>工作小組會議已於 2015 年 8 月 10 日、8 月 26 日及 9 月 10 日舉行，討論《升降機槽工程安全指引：第 4 卷一建造工地升降機》的草擬。指引正在草擬中，預計於 2015 年底或 2016 年初提交予專責小組檢視。</p>
3.7	CIC/CSY/P/019/15 (參考文件)	<p>應用創新設計以提高建造安全工作小組的工作進展</p> <p>倒車射頻識別感應/警報系統已於 2015 年 8 月在三個場地進行測試，並將於 2015 年 9 月在另外兩個場地進行測試。此外，香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心將於 2015 年 10 月完成 10 套安全帶緊扣感應系統的試驗裝置，並會安排測試。</p>
3.8	CIC/CSY/P/020/15 (參考文件)	<p>「工地安全體驗計劃 2015」的工作進展</p> <p>「工地安全體驗計劃 2015」(由建造業議會與香港建造商會合辦)的啟動禮及第一班的訓練課程已於 2015 年 8 月 27 日在馬灣的挪亞方舟圓滿舉行，現正安排大約 8 班訓練課程予承諾參與的大專院校。</p>
3.9	CIC/CSY/P/021/15 (參考文件)	<p>工地安全事故非正式專責小組的工作進展</p> <p>建造安全海報第 002/15 號－「佩戴安全帽小貼士」已於 2015 年 9 月 1 日正式發表，並載於本文件的附件 A 供成員參考。</p> <p>鄺超靈先生於會議上分享一些從日本製造的優質安全帽，經商議後，成員對高質量的安全帽表示欣賞，專責小組成員期後或需對安全海報的內容作出檢視。</p>

3.10	CIC/CSY/P/022/15 (參考文件)	安全施工程序檢討專責小組的工作進展 「香港建造業安全施工程序籌備指引(針對已識別出的三個高風險項目)」顧問服務的標書文件已經擬備，並正進行招標事宜，顧問服務預計於 2015 年底或 2016 年初展開。此外，顧問研究督導小組的成員名單已更新，督導小組的主要職能為監察獲委任顧問的進展及審核將由日後顧問所提交的項目成果。
3.11	(簡報) (參考文件)	經驗分享 – 新加坡借鑑考察團 議會秘書處就新加坡借鑑考察團進行經驗分享。成員對新加坡整體安全政策架構、建造業意外死亡率、風險管理 2.0、bizSAFE 計劃、安全設計、建造安全入門課程和工地項目表示欣賞。
3.12	(簡報) (參考文件)	經驗分享 – 第 31 屆國際職業衛生大會(韓國) 該議程將於下次建造安全專責委員會會議 004/15 中報告。
3.13	(簡報) (參考文件)	經驗分享 – 英國職業安全及健康學會年度研討會及展覽 2015 該議程將於下次建造安全專責委員會會議 004/15 中報告。
3.14		其他事項 (i) 沙田訓練場的「安全訓練中心」 議會秘書處建議建造業議會將與一承辦商合作成立及營運沙田訓練場的「安全訓練中心」。有些成員對於是次的合作模式表示關注，並要求議會秘書處作出檢視及跟進。 (ii) 2014 年建造業的工業意外死亡事故報告 該議程將於下次建造安全專責委員會會議 004/15 中報告。 (iii) 建造業安全體感及訓練中心(第一期) 議會秘書處報告建造業安全體感及訓練中心(第一期)的工作進展。秘書處使用徵求意向書為替代方案，但只收到一間公司回標，因而未能進行第二階段的招標程序。經商議後，成員同意試用另一個替代方案(即聘請外國專業的體感設備供應商)，嘗試為是次項目的體感訓練儀器進行設計和安裝。

註：在建造安全專責委員會會議上討論的上述文件及進展報告全文，可應議會成員要求由議會秘書處提供。

佩戴安全帽小貼士


良好的作業模式








佩戴適當及有下頷帶的安全帽，穩固又安全。



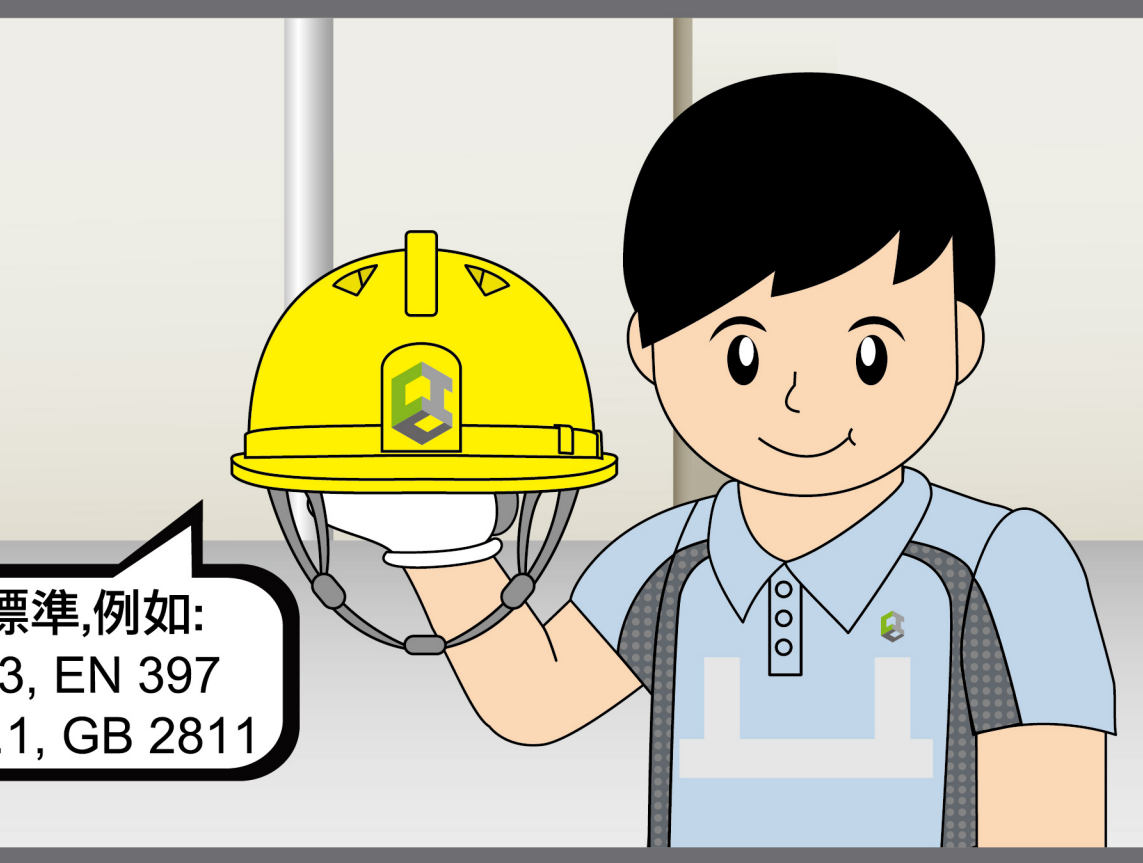


符合的標準,例如:
ISO 3873, EN 397
ANSI Z89.1, GB 2811


選用符合國際/國家標準的安全帽。





注意安全帽有效日期，切勿佩戴過期安全帽。



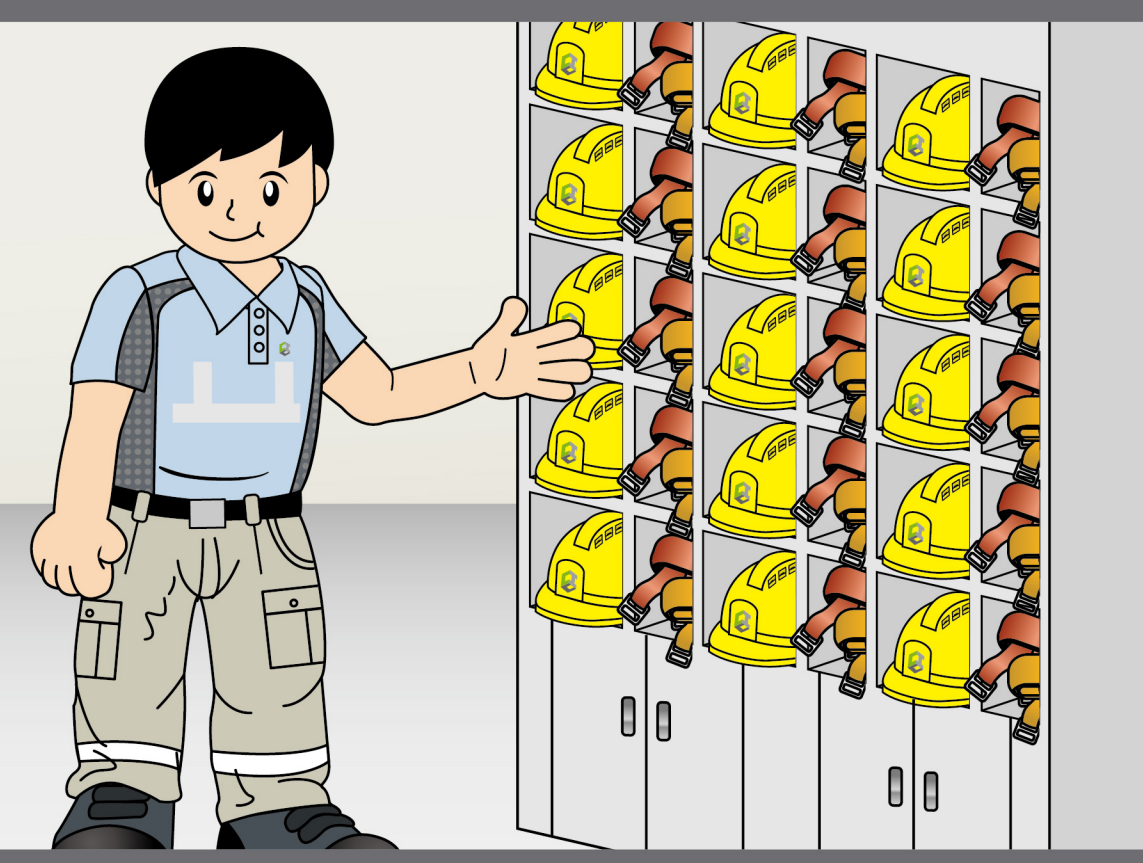

妥善存放安全帽及切勿存放於被陽光直接照射的地方。





應使用製造商的原裝附加配件，或按製造商指示選用相容的配件。





定期檢查及清潔安全帽。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2015 建造業議會

地址：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：enquiry@hkciic.org
